

ДО
РЗОК - ДОБРИЧ
УЛ. "НЕЗАВИСИМОСТ" № 5, ЕТ. 4
ГРАД ДОБРИЧ

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От Прогрес 99 ООД представлявано от Управителя /изп. директор/ Лариса Степановна Димитрова с ЕГН 5805074196

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

С настоящото представяме нашето техническо предложение за изпълнение предмета на обществената поръчка по обявената от Вас открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Текущ ремонт на работни и санитарни помещения, стълбищна клетка, фасадна облицовка и аварийно стълбище в сградата на РЗОК – Добрич“.

За изпълнението на обществената поръчка разполагаме с оборудване, машини, съоръжения и квалифициран технически персонал и работници.

ПРЕДЛАГАМЕ:

Да изпълним поръчката, съгласно изискванията на Възложителя при следните условия:

1. Срок за изпълнение на СРР: 19 / деветнадесет / календарни дни.

Забележка: Срокът на изпълнение не може да бъде по-голям от 60 (шестдесет) календарни дни!

2. План за организация и изпълнение на СРР, който сме разработили съобразно изискванията на Възложителя, както и отделните етапи и сроковете за изпълнение, който включва:

2.1. Обяснителна записка, със следното съдържание:

- Описание на отделните етапи на изпълнение на поръчката;
- Описание на видовете СРР и тяхната последователност на изпълнение;
- Организация и методи на изпълнение;

3. Гаранционен срок на извършените строително-ремонтни работи: 60 / шестдесет / месеца, от датата на тяхното приемане от Възложителя.

Забележка: Гаранционният срок не може да бъде по-малък от нормативно определените по Наредба № 2 за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.


За този период се ангажираме да отстраняваме всички скрити дефекти и недостатъци, появили се в гаранционния срок на СРР, съгласно договорните условия.

* Техническото предложение се поставя в Плик № 2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката“ на Прогрес 99 ООД (името на участника)!

Дата: 16.09.2014 г.

Участник:
/подпис и печат/



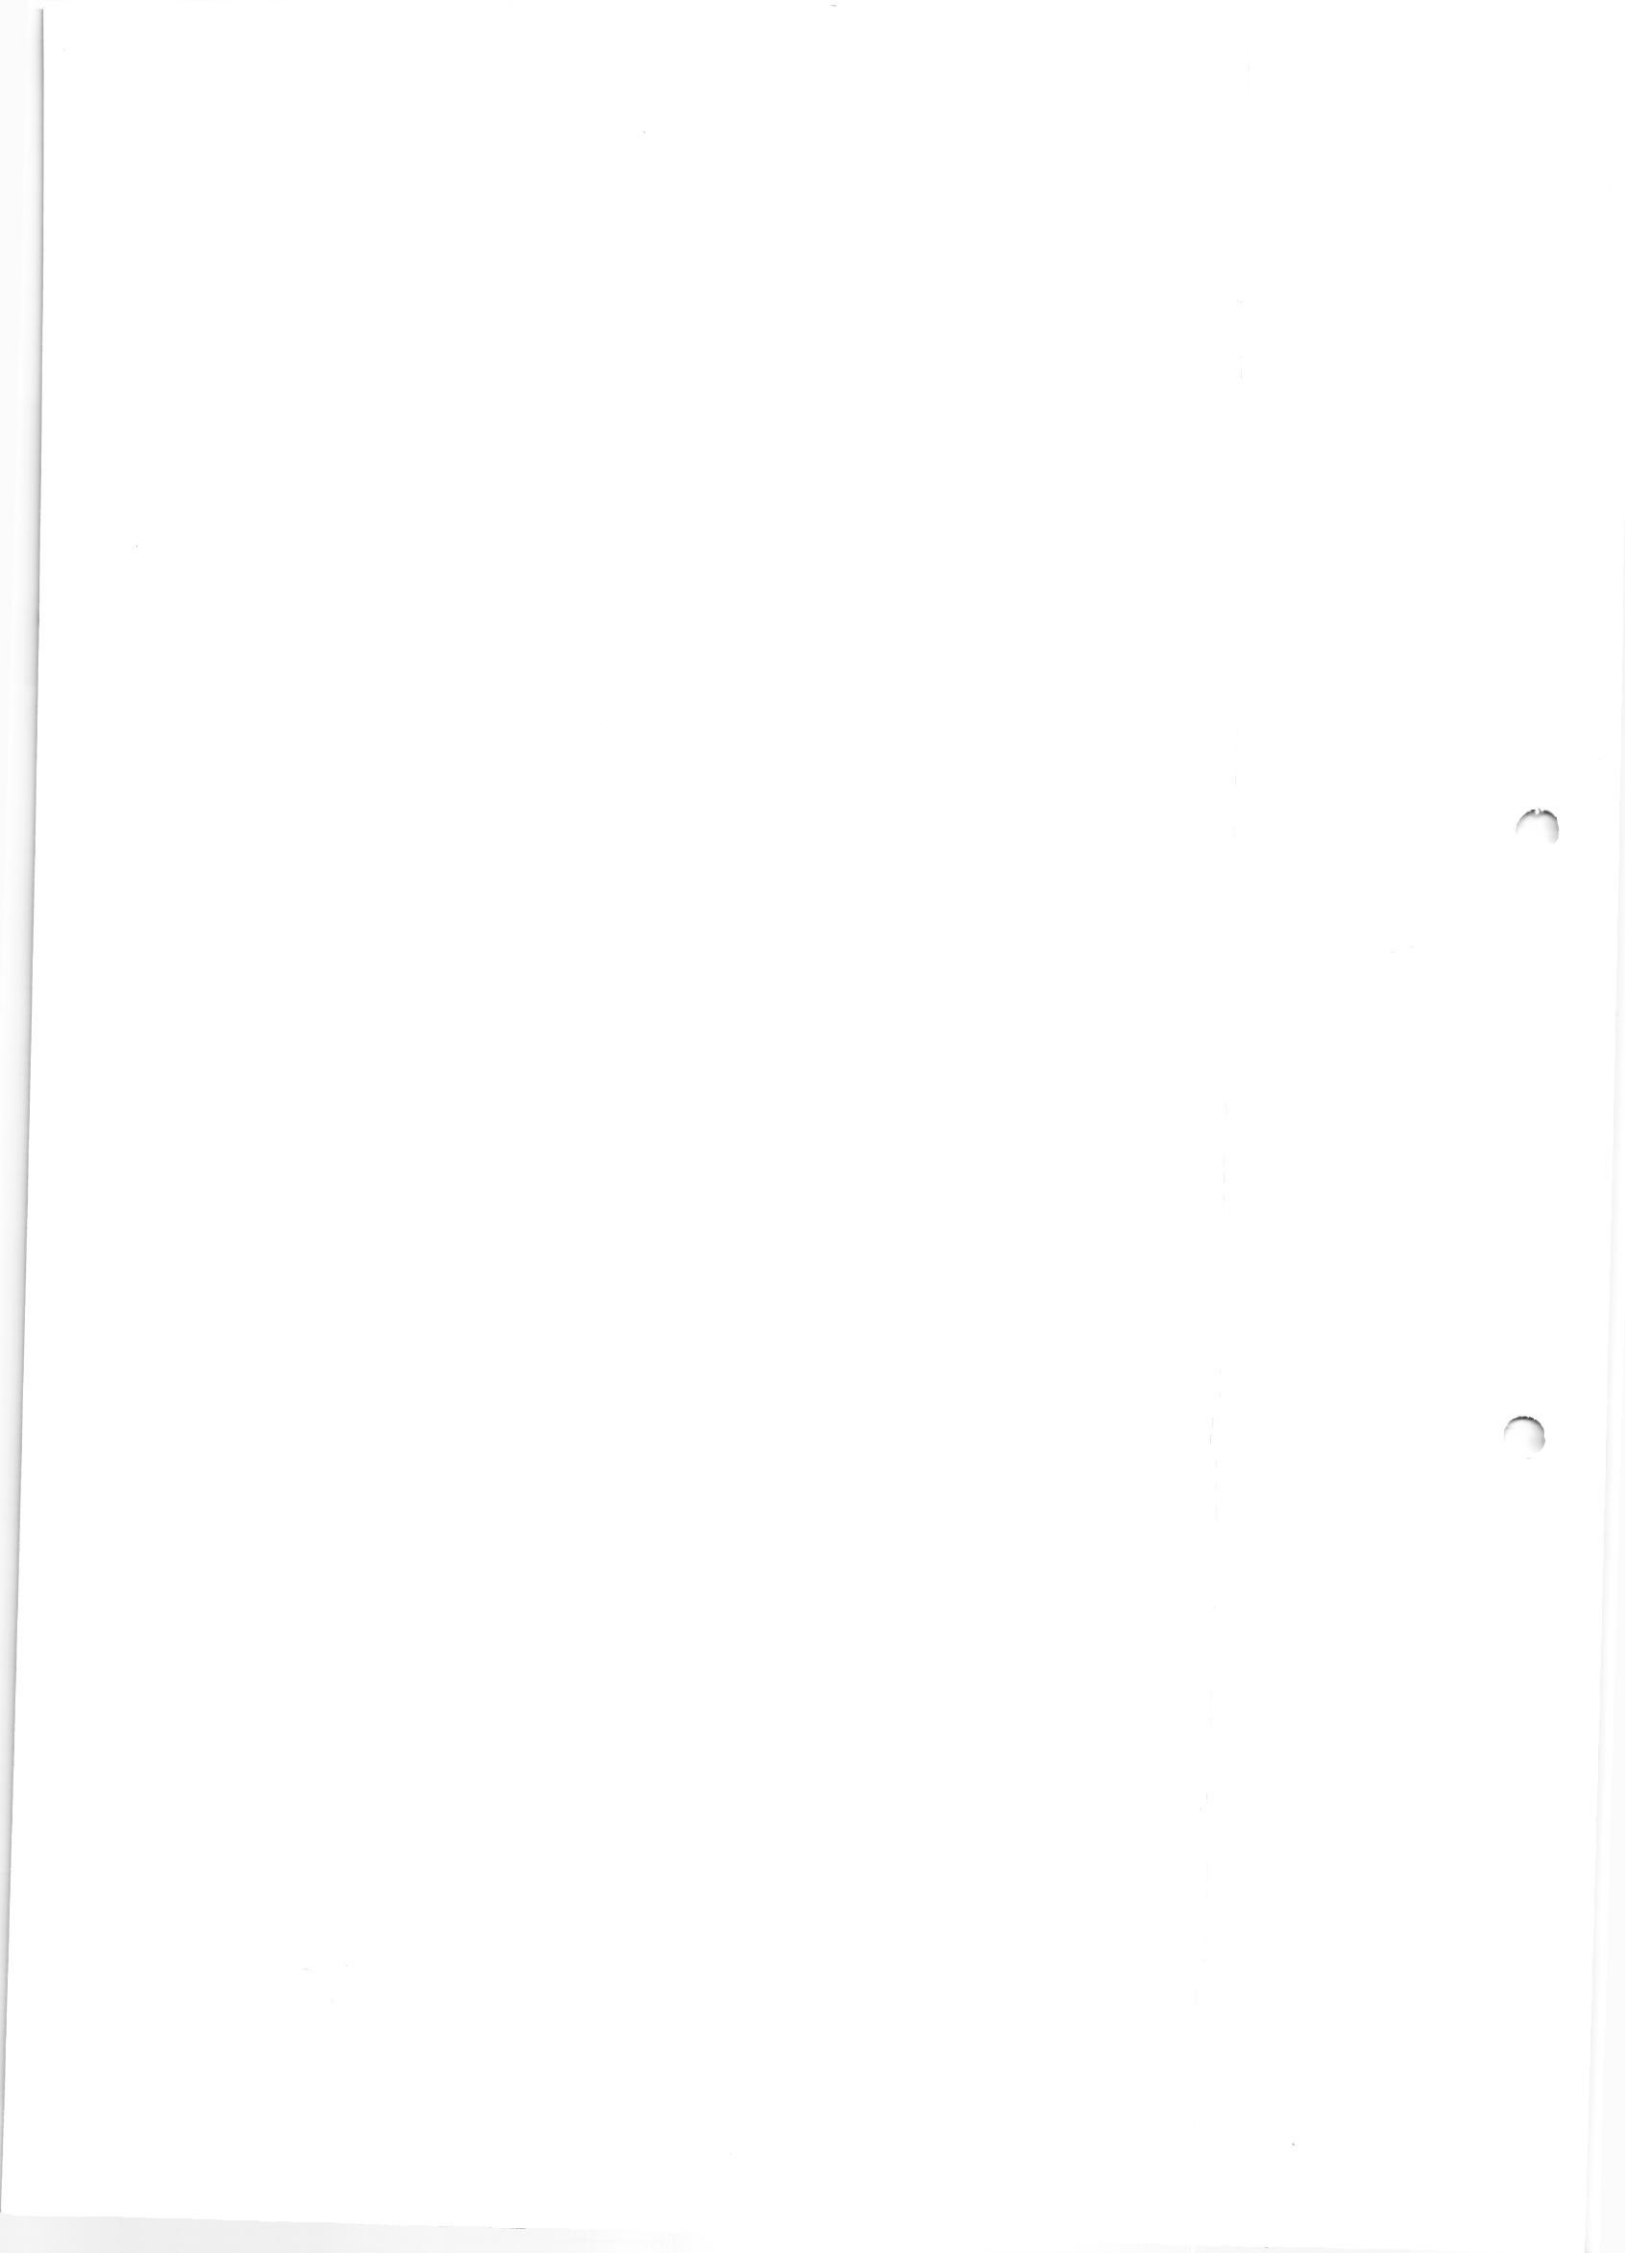

Обект: „Текущ ремонт на работни и санитарни помещения, стълбищна клетка, фасадна облицовка и аварийно стълбище в сградата на РЗОК – Добрич“

План за организация и изпълнение на СМР

Съдържание:

- 1.Обяснителна записка
- 2.Календарен график
